

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

SHCP  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MST

Registro de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Tipo de recurso:

Municipio:  Ciclo de recurso:

Programa Presupuestario:

Nombre:  Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución/Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	NO124042500150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COATLÁN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JOSE CALLE PRIV. MORELOS - 406005 <a href="#">Ver registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatlán del Río	<a href="#">Registar Avance</a>
Proyecto de inversión	NO124042500203	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MORA HAZIA SAN FELIPE - 406000 <a href="#">Ver registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatlán del Río	<a href="#">Registar Avance</a>
Proyecto de inversión	NO124042495505	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y DIVISIONES PARA ESCUELA PRIMARIA DEL RÍO, LOCALIDAD CUERNAVACAQUITA - 305422 <a href="#">Ver registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatlán del Río	<a href="#">Registar Avance</a>
Proyecto de inversión	NO124042495615	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y CANCHAS EN ÁREA DE RECREACIÓN DE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatlán del Río	<a href="#">Registar Avance</a>

Seguimiento de los Recursos

inst.hacienda.gob.mx/ft-web/proposito/Estado/Avances/propósito=2405535

Unidad de Medida:  Meta:  Meta Modificada:  [Editar](#) [Eliminar](#)

Geolocalización

Tipo de gobernancia:  [Agregar gobernancia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Veracruz	Coatlán del Río	Coahuacanguito	CALLE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO CUERNAVACAQUITA, CERRA CUERNAVACAQUITA, CONTIENEN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE CALLE SAN PEDRO Y CAMINO GENERAL AL CAMPO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE CUERNAVACAQUITA	18.72352281 99.49580824	<a href="#">Eliminar</a>

Powered by Leaflet. © OpenStreetMap contributors

Seguimiento de los Recursos

ms.hacienda.gob.mx/segui.../propositoGasto/ver/anexo/propósito=2485535

Monto Global Aprobado: \$2,292,034.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAS	Aprobado	Modificado	Acción
RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COLABORACIONES)	2024	05 - Aportaciones federales para entidades federativas y Municipios	1004 - HAs Municipales de las denominaciones controladas del ramo estatal	HAs municipal	\$2,292,034.00	\$2,292,034.00	<a href="#">Ver</a>

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Reservado	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$2,292,034.00	\$2,292,034.00	\$2,292,034.00	\$2,292,034.00	\$2,292,034.00	100%	<a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 240

Meta Modificada: 240

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 OCT-DIC	240	100%	<a href="#">Editar</a>

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

Seguimiento de los Recursos

ms.hacienda.gob.mx/segui.../propositoGasto/ver/anexo/propósito=2485535

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

mimadominguezg

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa


Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	MCS/RR/ly/09/09/R33F3/2024/000	FOGAR JUVENIL WANGAS	MUNICIPIO DE COATI AN DFL RIO	\$2,000,737.67	\$2,292,034.00	<a href="#">Ver detalles</a>	<a href="#">Borrar</a>

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

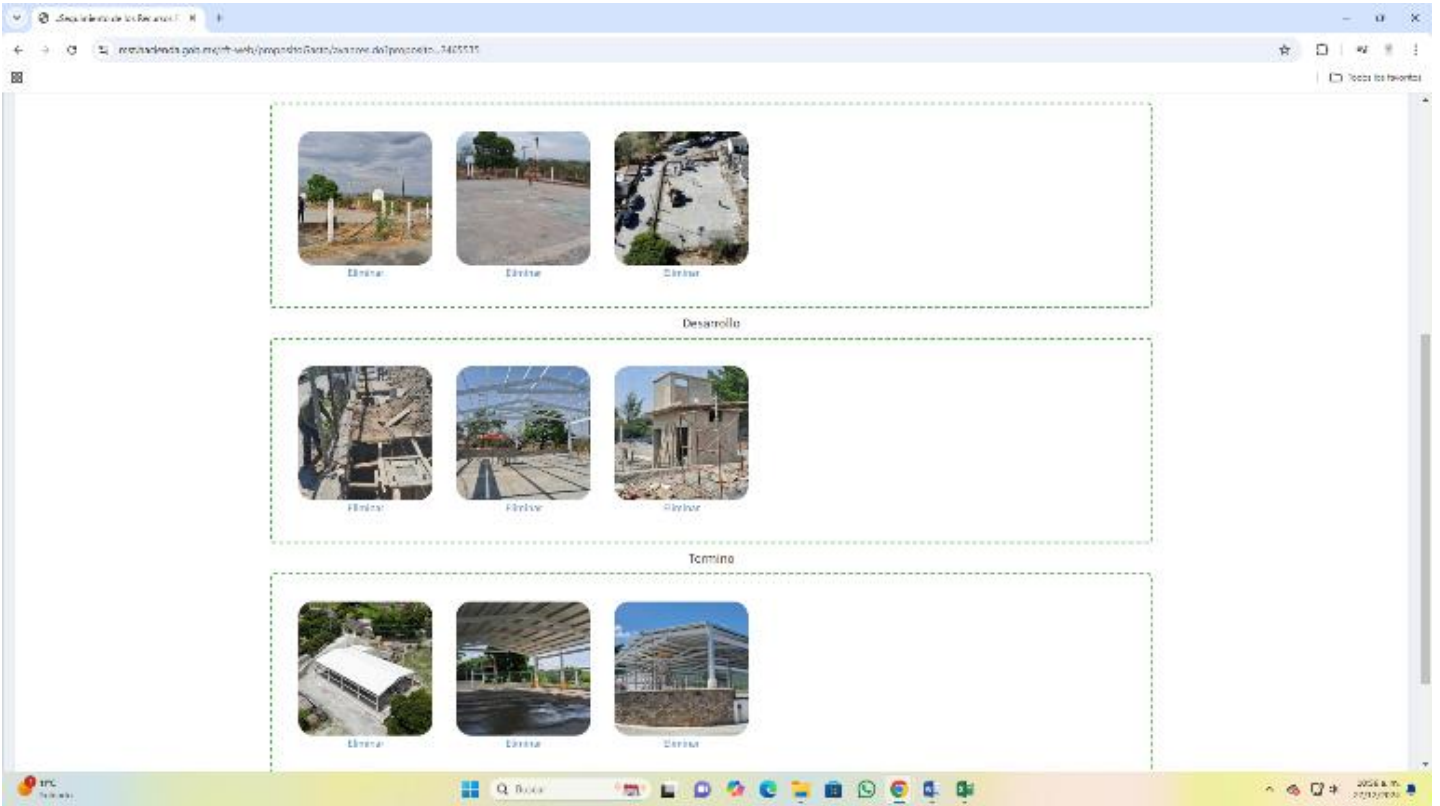

The screenshot shows a web application dashboard for financial management. A modal window titled "Avance Financiero" is open, displaying a list of financial metrics with values and checkmarks:

Categoría	Valor	Estado
Recaudado	\$188,493.63	✓
Comprometido	\$188,493.63	✓
Devengado	\$188,493.63	✓
Ejercido	\$188,493.63	✓
Pagado	\$188,493.63	✓

The background dashboard displays the following information:

- Fuentes de Financiación:**
  - Monto Global Aprobado: \$200,000.00
  - Tipo de Recurso: FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
  - Ciclo de Recurso: 2024
- Avance Financiero:**
  - Registrar Avance
  - Tabla con columnas: Periodo, Recaudado
  - 2024 / JUL-SEP: \$172,624.62
  - 2024 / ABR- JUN: \$122,873.90
- Avances Físicos:**
  - Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 90.55%
  - Unidad de Medida: Metros Lineales
  - Meta: 1425.1
  - Meta Modificada: 1425.1
  - Registrar Avance
  - Porcentaje Total de la Meta: 90.55%
  - Tabla con columnas: Periodo, Avance, Porcentaje, Acción
  - 2024 JUL- SEP: 1300, 91.59%, Confirmado
  - 2024 ABR- JUN: 2020, 92.60%, Confirmado

The browser's address bar shows the URL: <https://michlandia.gob.mx/fin-web/proyectos/financiamiento/proyecto/335/3354>.

Municipios

### Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devolvida	Ejecido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT - DIC	\$188,469.63	\$188,469.63	\$188,469.63	\$188,469.63	\$188,469.63	100%	Editar
2024 / JUL - SEP	\$179,254.63	\$179,254.63	\$179,254.63	\$179,254.63	\$179,254.63	100.00%	Confirmado
2024 / ABR - JUN	\$126,870.00	\$126,870.00	\$126,870.00	\$126,870.00	\$126,870.00	100.00%	Confirmado

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1485.7

Meta Modificada: 1485.7

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 OCT - DIC	1485.7	100%	Editar
2024 JUL - SEP	1380	92.99%	Confirmado
2024 ABR - JUN	1000	67.35%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SHCP Seguimiento

Contratos y administración directa

RFC del convocante: VCS6501018R5

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO

RFC del contratista: SDFST4022HS2

Nombre del contratista: SALVADOR SOTELO FLORES

Fecha de firma del contrato: 20/10/2024

Monto del contrato: \$1,200,547.50

Monto modificado: \$1,200,547.50

Artículo: Anticipo

Medialidad de contratación: Adjudicación directa

Fecha de conclusión según el contrato: 24/12/2024

Descripción del contrato: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD SAN JOSE CALLE PIRY MORELOS

Liga del contrato: <https://coastlandelrio.gob.mx/obrasPublicas>

Estatus del contrato: Terminó

Fecha de conclusión: 24/12/2024

Liga documento de evidencia: <http://coastlandelrio.gob.mx/obrasPublicas>

Monto	Eliminar
\$1,417,794.30	Eliminar
\$292,000.00	Eliminar
\$2,105,152.39	Eliminar
\$2,000,717.07	Eliminar
\$102,000.00	Eliminar

Anterior 1 2 3 4 5 ... 25 Siguiente

Seguimiento de los Recursos Financieros Transferidos

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: MCR/DSUyOP/R33F3-MPAL/2024/007  
 Número de contrato: MCR/DSUyOP/R33F3-MPAL/2024/000  
 Número de procedimiento: MCR/DSUyOP/R33F3-MPAL/2024/000

SHCP  
 MST

Contratos y administración directa

Filtro

Número de expediente:

Número del contrato:

Número de procedimiento:

Filtro por tipo

Contrato

Administración Directa

Consultar

Limpiar

Mostrar 2 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/003	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	EDGAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$1,411,204.00	Eliminar
Administración directa	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	SALVADOR SOTELO FLORES	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$100,000.00	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	SALVADOR SOTELO FLORES	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$2,175,052.00	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	EDGAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$2,000,737.67	Eliminar
Administración directa	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$100,000.00	Eliminar

Mostrar 1 al 5 de 171 registros

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Seguimiento de los Recursos

Administración Directa

Número de expediente: MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007

Número del contrato: MCR/DSUyOP/R33F3/2024/000

Número de procedimiento: MCR/DSUyOP/R33F3/2024/000

RFC del convocante: MCR09011095

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO

RFC del contratista: SOT2740221152

Nombre del contratista: SALVADOR SOTELO FLORES

Fecha de firma del contrato: 22/05/2024

Monto del contrato: \$1,534,000.00

Monto modificado: \$1,534,000.00

Artículo: Anticipo

Modalidad de contratación: Adjudicación directa

Tipo de contratación: Otros

Fecha de conclusión según el contrato: 19/11/2024

Descripción del contrato: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO

Link del contrato: <http://www.mh.fed.gob.mx/boe/contratos/>

Fecha de conclusión: 18/10/2024

SHCP  
 MST

Contratos y administración directa

Número de expediente:

Número del contrato:

Número de procedimiento:

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/004	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	EDGAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$1,411,204.00	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	SALVADOR SOTELO FLORES	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$100,000.00	Eliminar
Administración directa	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/007	SALVADOR SOTELO FLORES	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$2,175,052.00	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/002	EDGAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$2,000,737.67	Eliminar
Contrato	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MCR/DSUyOP/R33F3/2024/005	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$100,000.00	Eliminar

Mostrar 1 al 5 de 171 registros

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 -

Versión 1.0

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

SHCP

Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - 00100 - LOS RECURSOS DE 2014 - POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

Verión 1.0

2014/12/29 12:05:24

### Buscar Contrato

Folio de Contrato e Administración Directa

MERIDUJONPSPESP30224001

Presiona el botón para realizar la búsqueda

Buscar

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocatoria	Monto	Monto modificado
Servicio	NOTIDUJ07PSPR0371004001	PLAS PROYECTOS EN INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SANEAMIENTO, S.C.	MUNICIPIO DE COXTLAM DEL RÍO	\$22,012.00	\$22,012.00

Cancelar Agregar

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

SHCP

Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio


Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - 00100 - LOS RECURSOS DE 2014 - POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO


Verión 1.0

2014/12/29 12:05:24

### Inicio




Inicio




Inicio

### Desarrollo



Desarrollo

### Termino



Termino

Seguimiento de los Recursos

msi.hacienda.gob.mx/fin-web/registroCarteraAvanzado?proposito=2400315

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Político y Manifiesto / Componente FAS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALIZADOS IMPORTE OROS, SERVICIOS Y COMPAÑIAS	2024	23 - Asignaciones Federales para el Estado de Hidalgo y sus Municipios	1034 FAS Municipal y de las Demarcaciones Indígenas de Hidalgo Federal	FAS municipal	\$1,286,798.00	\$1,286,798.00	100% <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a>

**Avance Financiero**

Registrar Avance

Periodo	Presupuesto	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	Avance	Acción
2024 OCT-DIC	\$1,286,798.00	\$1,286,798.00	\$1,286,798.00	\$1,286,798.00	\$1,286,798.00	100%	<a href="#">Editar</a>

**Avances Fisicos**

Procentaje del Porcentaje de Avances Fisicos: **100.00%**

Unidad de medida: Metros Cuadrados    Meta: 240    Meta Modificada: 240  [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 OCT-DIC	240	100%	<a href="#">Editar</a>

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

NO SE ENVIARÁ INFORMACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Versión 1.0

Seguimiento de los Recursos

msi.hacienda.gob.mx/fin-web/registroCarteraAvanzado?proposito=2400315

SHCP    MST    Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos    Ciclo: 2024    Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)    minadominiguez




**Registros de Avances Individual de Proyectos** Proyectos del Sitio

Observaciones: **captadas**

Observaciones: **evadas**

Se puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 10Mb.

**Inicio**

**Desarrollo**



SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2024 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

mmadominguez

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Marcar como cancelado o como pendiente de validar los avances.

MOR 2024-10-065100  
MOR240402463615

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicitar Cancelación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA FONDOS FEDERALES - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD



Seguimiento de los Recursos

Nombre Global Aprobado: \$1,554,000.00

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Nombre	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal/Componente FMS	Aprobado	Modificado	Acción
AVANZOS FINANCIEROS, SUBSIDIOS Y OPORTUNIDADES	2024	Avances para el fortalecimiento de las Cárteras Federales y Municipales	2018-005 Municipal y de las Dependencias Territoriales de Distrito Federal	Municipal (q)	\$1,554,000.00	\$1,554,000.00	Editar

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$1,554,000.00	\$1,554,000.00	\$1,554,000.00	\$1,554,000.00	\$1,554,000.00	100%	Editar

Avances Físicos

Procentaje del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Meters Cuadrados, Meta: 600, Meta Modificada: 600



Avance total de la Meta: 100.00%



Periodo: 2024 OCT-DIC, Avance: 600, Porcentaje: 100%


Cancelar Anterior Guardar y Continuar





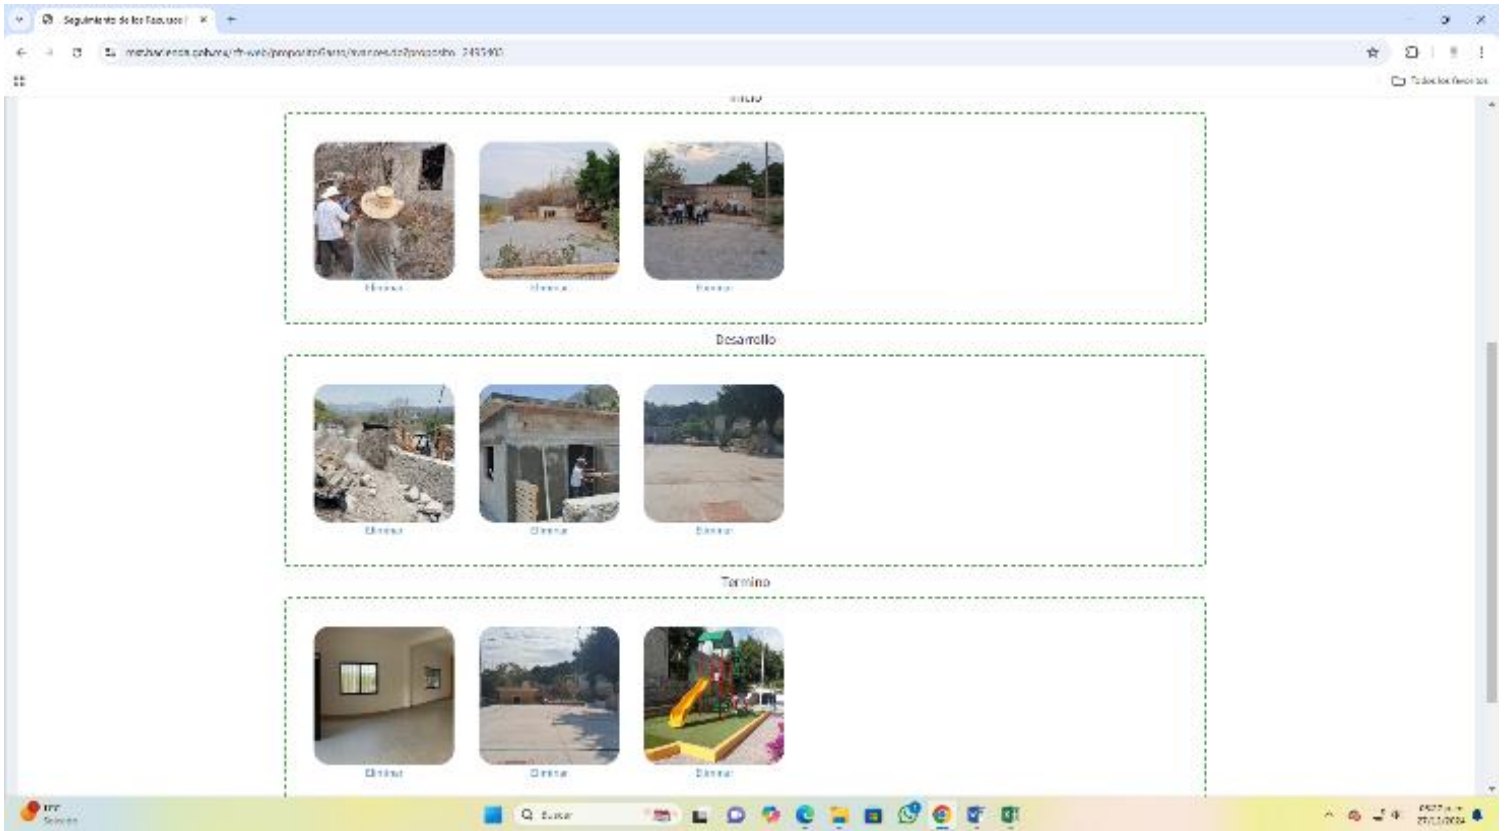

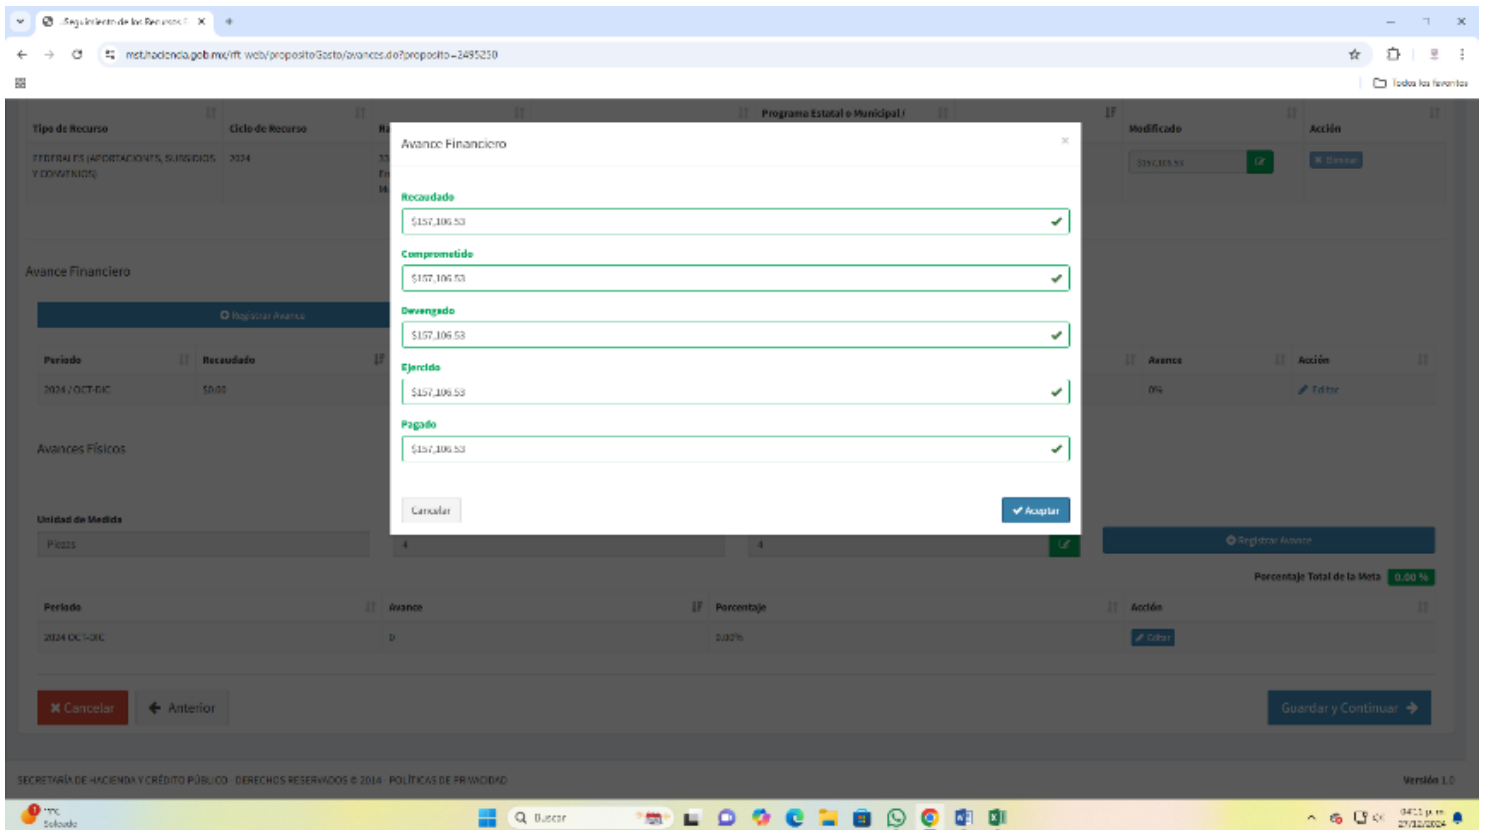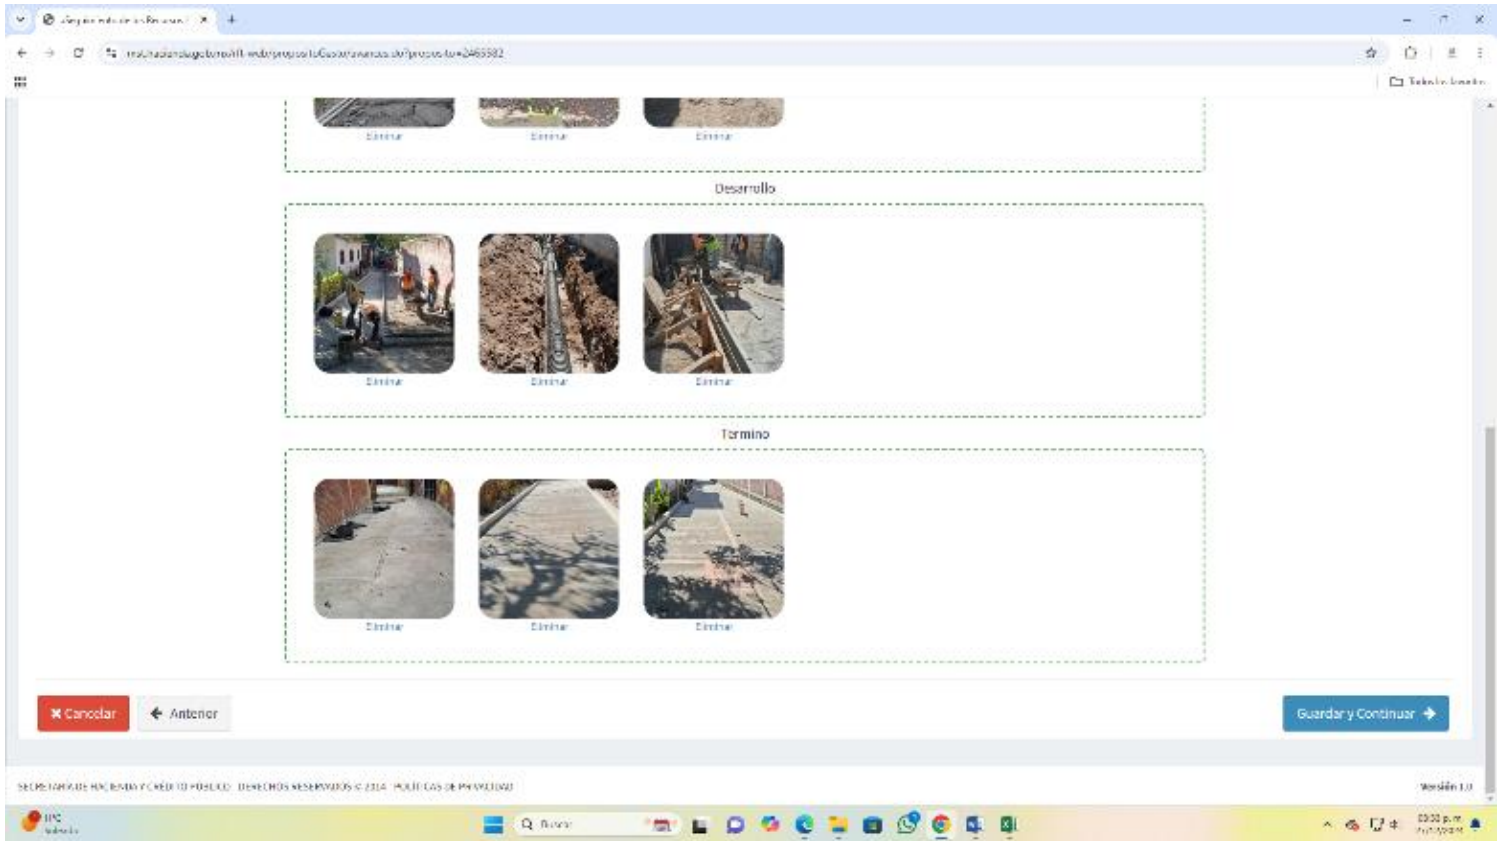

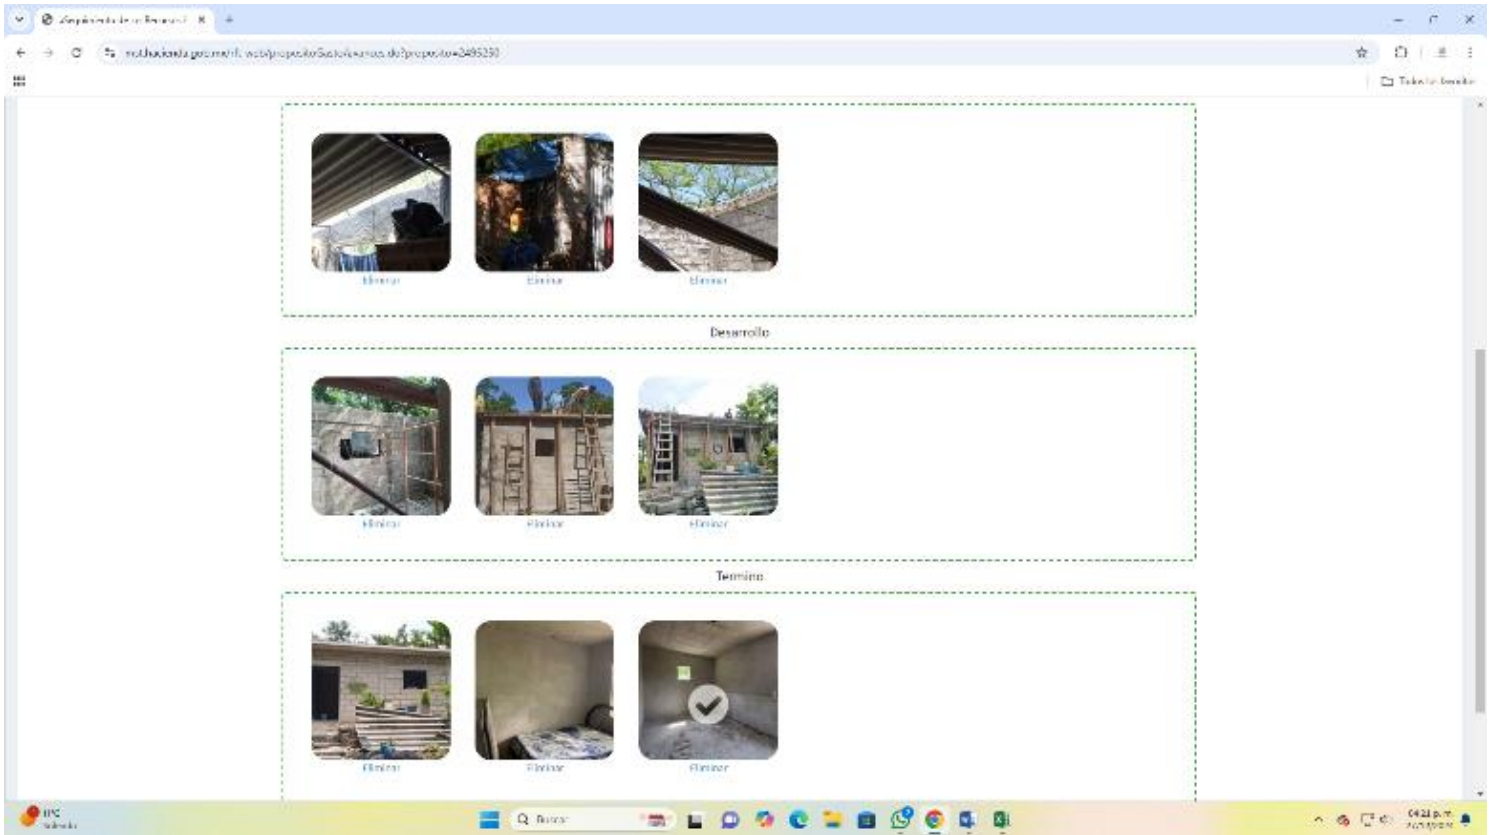

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2024 Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Bienvenido Panel de control

**Ejercicio y Destino**

**Ejercicio del gasto**

% del recurso pagado

Ver más

**Destino del Gasto**

% de proyectos validados

Ver más

**Resultados**

**Indicadores**

% con avance en el logro de metas

Ver más

**Evaluaciones**

El reporte de esta actividad se deberá realizar en el Sistema de Formatos Único

Ver más



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Panel de control

**Inicio**

Antes

Después

**Desarrollo**

Antes

Después

Antes

**Termino**

Antes

Después

Antes



### Carga Ejercicio del Gasto

Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

#### Información de carga

- Iniciando validación del archivo: plantillaEG.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 429,091.

#### Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
429091	27/12/2024 5:17 PM	plantillaEG.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar fotos</a>	<a href="#">Eliminar</a>
415521	2/10/2024 5:17 PM	plantillaEG.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar fotos</a>	<a href="#">Eliminar</a>
398672	5/7/2024 5:17 PM	plantillaEG.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar fotos</a>	<a href="#">Eliminar</a>
